


Århus Havn - Containerterminal Øst



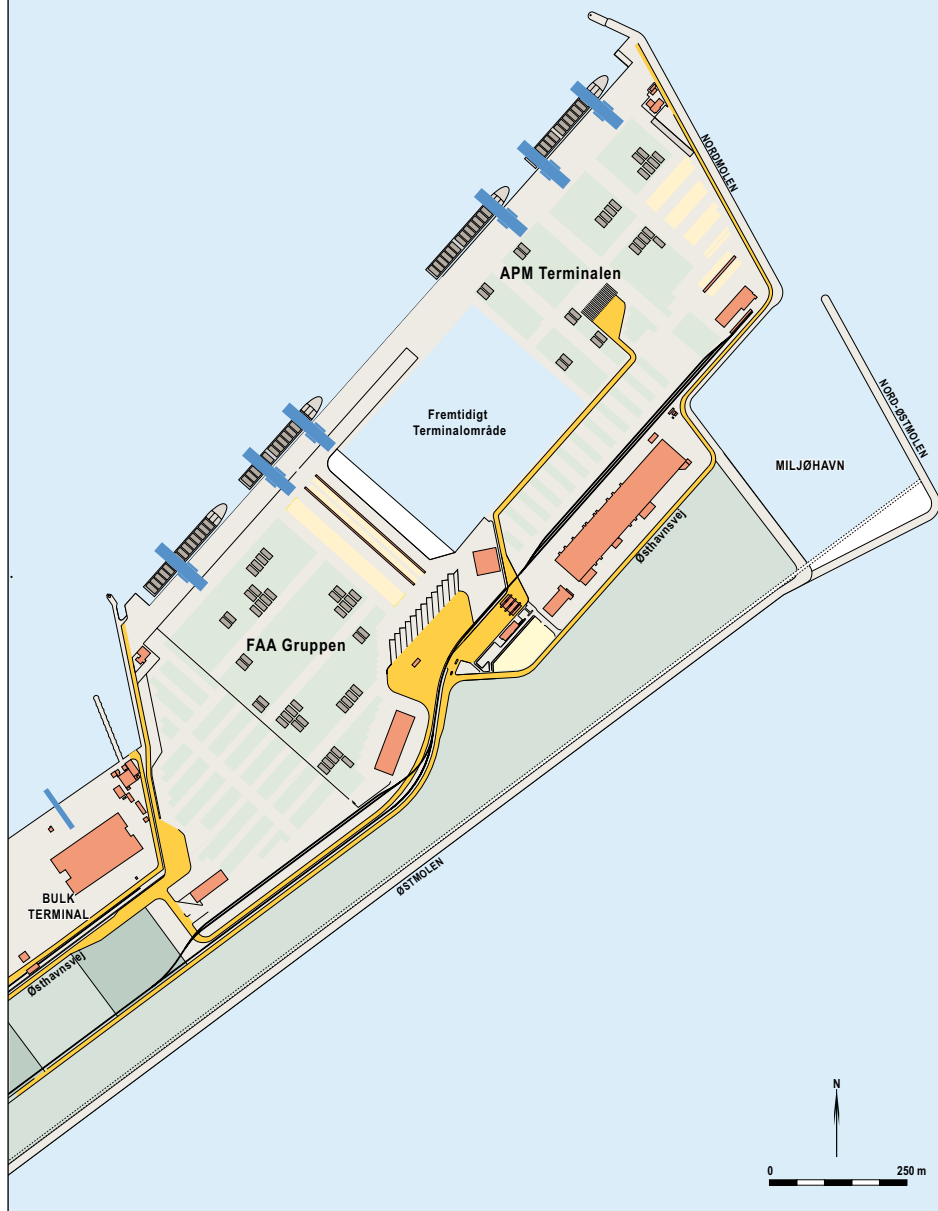

Den nye containerterminal

De ydre grænser af den nye containerterminal til FAA gruppen er nu udført, og et helt nyt havnekort viser sig, når man flyver hen over området.

Mod nordvest er den ydre grænse den nye 800 meter kaj, hvoraf 550 meter er støbt, og i øjeblikket er der travlhed på kajen med at færdiggøre de første 400 meter kranskiner. Kajen med skinner skal være færdig i august måned i år, hvorefter belægningsarbejdet skal udføres, og belægningsarbejdet på den nordligste del af kajen er startet.

På selve terminalområdet vest for Østhavsvej udføres betonstensbelægningen med to maskiner, der hver udlægger ca. 1.000 m² pr. dag, så der vil gå endda nogle dage før disse 230.000 m² er færdige.

Mod sydøst støder terminalen nu op til Østhavsvej, men efter planen skal vejen og jernbanen rykkes mod øst, så man får større dybde i terminalen fra kajen, hvilket er nødvendigt for at optimere driftssituationen. Området øst for Østhavsvej, der er opfyldt med byggejord, er ved at blive forbelastet med sand. Når forbelastningen har virket, påbegyndes anlægsarbejdet til jernbanen og Østhavsvejs nye placering.

